

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	건축디자인과
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 이상무(6741), 담당자 이영미(6742)		

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2024. 8월
- 위 치 : 경북 김천시 율곡동 922
- 사업규모 : 지하 1층/지상 1층 총2,997.89㎡
- 주요시설 : 실내 스포츠 테마파크 조성 등
- 사 업 비 : 총16,000백만원(국비 4,500 도비 1,350 시비 10,150)

### □ 추진실적

- 2022. 08. 01. ~ 2022. 08. 15 : 김천 도시계획시설(율곡동 제3호 근린공원) 사업 실시계획인가를 위한 열람공고
- 2022. 08. 25 : 공용건축물 건축허가
- 2022. 09. 20 : 청소년테마파크 건립 공종별 원가심사(소방,통신,전기)
- 2022. 12. 12 : 건축, 소방, 전기, 통신 계약 및 착수
- 2023. 05. 26 : 실내콘텐츠 도입 기술협의 위한 감독공무원 및 감리 협의
- 2023. 07. 25 : 설계의도 구현 용역 착수
- 2023. 11. 02 : 실내콘텐츠 설치에 대한 계약심의위원회 개최
- 2023. 11. 04 : 실내컨텐츠 사전 규격 공고
- 2023. 11. 27 : 진입도로 개설공사 착공
- 2023. 12. 29 : 건축, 전기, 소방, 통신공사 기성

연차별 추진실적/계획

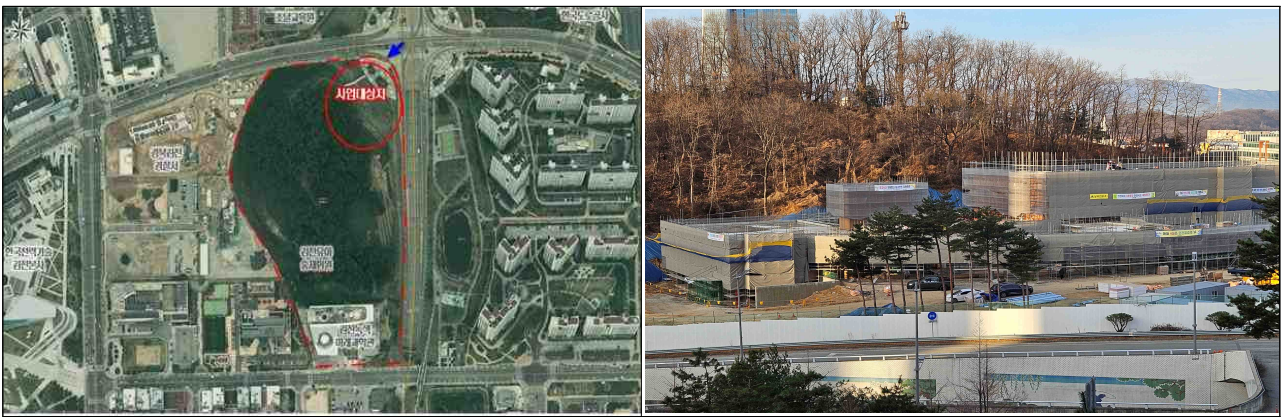
연도	주요사업내용	비고
2022	건축공사 착공	
2023	공사 공정률 60%, 실내콘텐츠 사전규격 공고	
2024	운영관리계획 수립 및 준공	
2025	준공 및 운영	
2026	준공 및 운영	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	입기 내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	16,416	315	15,997	3,105	5,581	6,999	208	104	104
국비	4,500	310	4,190	2,951	1,239	-	-	-	-
도비	1,350	-	1,350	47	1,304	-	-	-	-
시비	10,566	5	10,457	107	1,333	6,594	1212	1211	104

위치도 및 사진대지



문제점 및 대응조치/계획

- 타 유사사례 시설과의 차별성 통한 경쟁력 확보
  - 국내·외 선진 최신 콘텐츠 벤치마킹
- 운영비 절감 및 관리 방안 확보
  - 운영 및 시설관리 노하우 습득을 위한 전문업체 위탁방안 고려

□ 기대효과

- 청소년·가족 전용 실내스포츠 테마파크 조성으로 정주여건 개선 및 도시이미지 제고
- 녹색미래과학관(과학교육), 유아 숲 체험원(야외체험)과 연계하여 청소년들의 다양한 여가활동 지원을 통한 삶의 질 향상
- 고부가가치 스포츠 체험콘텐츠 운영을 통한 높은 수익성 기대


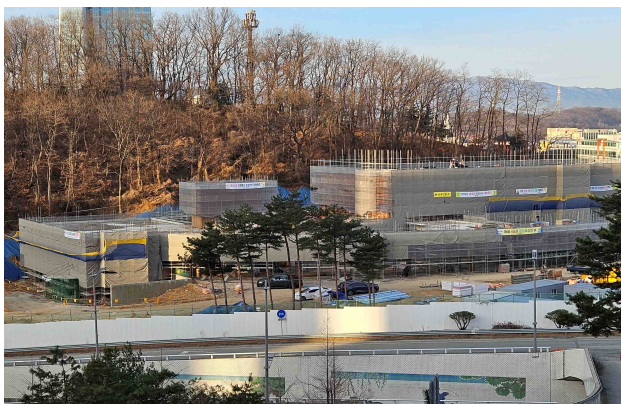
□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 정상추진

○ 공약달성 확인지표

- 2022 ~ 2023년 : 실시설계인가 및 공사착수

○ 추진실적

 <p>수신 내부결재 (경유) 제목 김천혁신도시 어린이(가족) 특화 생활SOC 건립 기본 및 실시설계 용역(실계공모) 시행</p> <p>혁신도시 정주 여건을 개선하고 대도시와 교육·체험 격차를 해소하기 위해 추진 중인 김천혁신도시 어린이(가족) 특화 생활 SOC 건립 기본 및 실시설계 용역(실계공모)를 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사 업 명: 김천혁신도시 어린이(가족) 특화 생활 SOC 건립 기본 및 실시설계 용역</li> <li>2. 사업위치: 김천시 용곡동 922</li> <li>3. 사 업 비: 금328,000,000원(금삼억이천팔백만원)</li> <li>4. 사업규모: 연면적 2,385㎡, 지상 1층</li> <li>5. 발주방법: 일반실계공모(조달청 의뢰)</li> <li>6. 예산과목: (부서)미래혁신전략과 (장비)성공적인 혁신도시 건설 (단위)혁신도시 활성화 추진 (세부)혁신도시 어린이(가족)특화 생활SOC건립사업(근로) (관상목)401 시설비및부대비 (통계목)01시설비</li> </ol> <p>붙임 1. 설계서 1부. 2. 설계공모지침서 1부. 3. 귀엽지서서 1부: 끝.</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>혁신도시지원 주무관 김수민</td> <td>혁신도시지원 팀장 박상민</td> <td>미래혁신전략 과장 송창</td> <td>경제관광정책 팀장권</td> </tr> <tr> <td>부서장 이항재</td> <td>혁신주무관 최경순</td> <td>기획팀장 권형순</td> <td>회계과장 이승기</td> </tr> </table> <p>시행 미래혁신전략과-2130 열수</p> <p>주 09532 중앙북도 김천시 서청1길 1, 김천시청 미래혁신전략과 1신 / www.gimcheon.go.kr (공통)</p> <p>전화번호 054-420-6742 / 팩스번호 054-420-6919 / sookim@kres.kr / 비공계(5)</p> <p>추진등록번호) 없음(근거 없음) 주어져도 받아서도 안됩니다.</p>	혁신도시지원 주무관 김수민	혁신도시지원 팀장 박상민	미래혁신전략 과장 송창	경제관광정책 팀장권	부서장 이항재	혁신주무관 최경순	기획팀장 권형순	회계과장 이승기	
혁신도시지원 주무관 김수민	혁신도시지원 팀장 박상민	미래혁신전략 과장 송창	경제관광정책 팀장권						
부서장 이항재	혁신주무관 최경순	기획팀장 권형순	회계과장 이승기						
<p>&lt;기본 및 실시설계 용역 시행공문&gt;</p>	<p>공사추진 현장 사진</p>								
