

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적, 예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	완료
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 김영찬(6462), 담당자 이송미(6464)		

## □ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 위 치 : 김천시 개령면 덕촌리 493-1번지 일원
- 사 업 비 : 36,500백만원(국비 18,700 도비 2,580 시비 15,220)
- 사업규모 : 65,213㎡ (약 19,760평)
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업내용 : 드론 실기시험장 및 관제시설 구축

## □ 추진실적

- 2021. 12. : 드론실기시험장 사업실시계획 인가고시
- 2022. 01. : 드론실기시험장 부지조성 토목공사 착공(김천시)
- 2022. 03. : 2022 드론실증도시 구축사업 선정, 시행
- 2022. 11. : 드론실기시험장 건축공사 착공(한국교통안전공단)
- 2022. 12. : 드론실증도시 평가 ‘우수’ 획득, 차년도 사업자 지정
- 2023. 06. : 실기시험장 배수로 공사, 미등기 및 소유자 확인 불가 토지 수용(3필지), 국·공유지 무상귀속(9필지)
- 2023. 12. 22. : 드론자격센터 건축공사 준공(한국교통안전공단)

□ 연차별 추진실적/계획


연도	주요사업내용	비고
2022	11월 건축공사 착공(한국교통안전공단)	
2023	12월19일 건축공사 준공(시설명칭: 김천드론자격센터)	
2024	6월 기타 주변 토목공사 준공(김천시)	
	운영 및 연구개발 병행	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	36,500	14,760	21,740	12,640	9,100			
국비	18,700	2,800	15,900	6,800	9,100			
도비	2,580	2,580						
시비	15,220	9,380	5,840	5,840				

□ 위치도 및 조감도

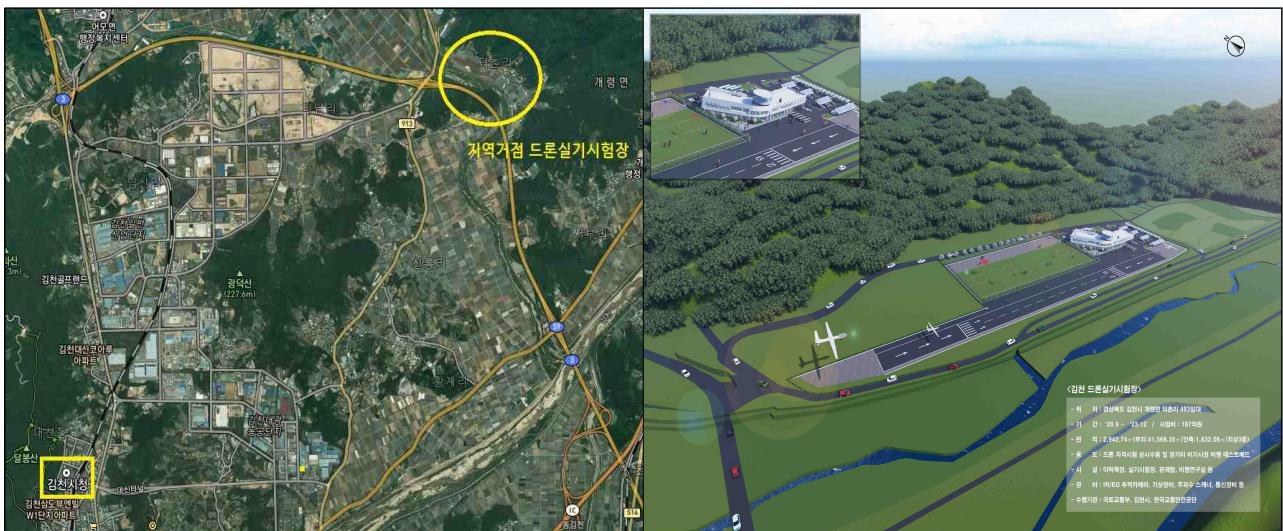

□ 문제점 및 대응조치/계획

- 현재 문제점 없음

□ 기대효과

- 2026년까지 연평균 29% 급성장이 예상되는 향후 드론시장에 주요 인프라 구축으로 지역거점 입지 선점
- 연간 약 1.3만명 규모의 자격시험자 및 교육인원 발생으로 지역 경제 활성화 기대
- 드론관련 고급 인프라 구축으로 기업 유치 및 연구개발을 통한 새로운 전략산업 육성 가능

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 완료

- 공약달성 확인지표
  - 2022 ~ 2023년 : 공사 착공 및 준공
- 추진실적 [드론자격센터 준공] 2023. 12월

