

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	축산과	협업부서	산림녹지과, 율곡동
공약실명제	과장 이상명(2580), 팀장 장명현(2571), 담당자 진병규(2572)		

□ 사업개요

- 사업명 : 반려동물 친화도시 인프라 구축
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2026. 12월(5개년)
- 소요예산 : 20억원
- 사업내용 : 반려동물 친화도시 조성을 위한 인프라 구축
 - 동물보호센터 건립 (2022년 ~ 2023년)
 - 반려동물 문화조성사업 : 애견파크, 반려동물 산책로, 애견놀이터 등
 - 동물보호 문화축제 개최 : 동물보호·복지 의식 향상 및 정책 홍보

□ 추진실적

- 2022. 4월 : 유기동물보호센터 건립 사업부지 선정
- 2022. 8월 : 세부위치 확정
- 2022. 9월 : 실시설계 계약
- 2022. 12월 : 실시설계 완료
- 2023. 3월 : 경상북도 계약원가 심사 통과
- 2023. 4월 : 시공업체 선정, 착공 및 공사 중지
 - ※ 배양실 토목공사 지연에 따른 공사 중지
- 2023. 8월 : 공사 재추진
- 2023. 12월 : 유기동물보호센터 준공 완료
- 2024. 1월 : 동물보호팀 신설

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	· 동물보호센터 건립 : 실시설계	
2023	· 동물보호센터 건립 : 건축물 착공 및 준공 · 반려동물 문화조성사업 추진 : 예산확보 및 사전타당성 검토	
2024	· 동물보호센터 운영 : 체계적인 관리를 위한 전담운영팀 신설 · 운영 · 반려동물 문화조성사업 추진 : 예산확보 및 세부사업 추진	
2025	· 반려동물 문화조성사업 추진 : 세부사업 추진 및 완료 · 동물보호 문화축제 추진 : 예산확보 및 사전타당성 조사	
2026	· 반려동물 문화조성사업 운영 : 반려동물 공원조성, 놀이터, 산책로 등 운영 · 동물보호 문화축제 개최 : 반려동물 친화도시 대 · 내외적 홍보	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	입기 내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	2,000		2,000	27	640	300	900	100	
국비	210		210	8	192	-	-	-	
도비	650		650	-	-	150	450	50	
시비	1,140		1,140	19	448	150	450	50	
민자	-		-	-	-	-	-	-	
기타	-		-	-	-	-	-	-	


□ 유기동물보호센터(신축) 위치도 및 사진대지



위치도



외부 전경

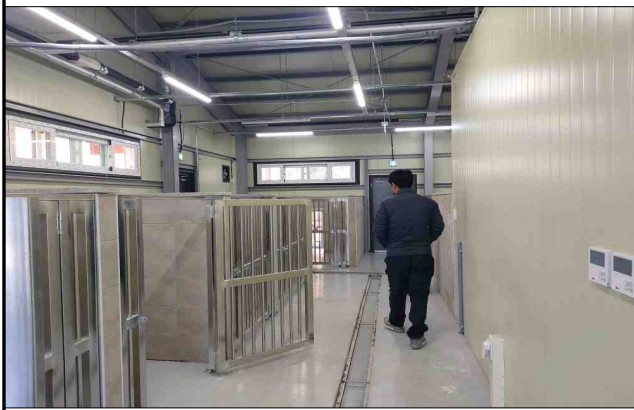

내부 전사



외부 전사

□ 반려동물 공원조성(애견파크) 사업 위치도 및 사진대지



율곡동 939 일원(도로공사 뒤 안산공원 부지)

□ 문제점 및 대응조치/계획

- 반려동물 공원(애견파크) 계획면적 협소(현재계획: 1,000㎡)
 - ☞ 실제 조성되지 않은 공원시설 면적 활용을 통한 계획면적 확대
- 매년 유기동물 발생신고 및 관련민원 급증
 - ☞ 업무에 능동적으로 대처할 수 있는 전담 인력 확보 필요
- 반려동물 문화조성 사업추진 시 비반려인과의 충분한 공감대 형성이 필요하고, 관련 시설로 인한 비반려인의 갈등을 예방하고 공존할 수 있는 관련 대책 마련 필요

□ 기대효과

- 반려인구 1,500만 시대에 급증하는 반려동물 관련 민원 발생에 적극 대처하고, 시민들의 높은 행정요구에 대응하는 만족행정 구현
- 동물보호·복지와 생명존중에 대한 시민들의 의식 향상 및 동물보호 복지정책 적극 추진으로 반려동물 친화도시 조성 및 시 이미지 제고

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 정상추진

- 공약달성 확인지표 : **2022~2023년 지표 없음**
- 집행실적
 - 2023. 12월 : 유기동물보호센터 준공(2024년 지표)



위치도



외부 전경
